

**ACTA DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC, EFECTUADA EL DÍA 18 DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de San Luis Potosí, capital del mismo nombre constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 18 de junio del año 2015, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por su Comisionada Presidenta la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de fecha 28 de abril de 2015.
4. Informe relativo a la entrega- recepción de la obra correspondiente a la sala de juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
5. Informe de la entrega parcial del proyecto de obra para que pudiera ser utilizado el salón de pleno.
6. Informe sobre los trabajos de descarga pluvial.
7. Programación de la entrega – recepción de la obra y sus informes finales.
8. Asuntos Generales.

**En cuanto al primero punto del Orden del Día**, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez y la Lic. Lizbeth Lara Tovar en su carácter de Secretario Técnico, por lo que se declaró que se encontraban presentes la mayoría de los integrantes de la Comisión, declarándose la existencia de quórum, y por lo tanto los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

De igual forma a la sesión asistieron los C.C. Ing. Carlos A. Macías Martínez, Supervisor de Obra ambos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado y el Ing. Jesús Rodríguez Ventura en su carácter de Superintendente de Obra de la empresa Aslam, Corp, S.A. de C.V.

**En relación al segundo punto del Orden del Día**, se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestado los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

**Por lo que hace al tercero punto del Orden del Día**, la Comisionada Presidenta Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, puso a consideración de los Consejeros Comisionados ahí presentes el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 28 abril de 2015, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

**Por lo que respecta al cuarto punto del Orden del Día**, la Comisionada Presidenta concedió el uso de la voz al Ing. Carlos A. Macías Martínez, quién manifestó que al día de la fecha se lleva un avance físico de un 90% noventa por ciento de la obra, toda vez que están por cerrar el dren-pluvial y concluir con la impermeabilización total de la obra.

Por otra parte comento que la fecha probable de la entrega-recepción de la obra que nos interesa, está programada para que el 30 de junio del año en curso por parte de la constructora Aslan Corp, S.A. de C.V., a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado, y posteriormente la Secretaria les informará la fecha que se tiene de entrega al Consejo.

La Comisionada Presidenta, preguntó al Ing. Carlos A. Macías Martínez, si en el acto de entrega-recepción entre la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado y este Órgano Electoral, el Contralor Interno puede estar presente, respondiendo el Supervisor que no había ningún problema de quienes asistieran a dicho acto, toda vez que era un acto público. Así mismo manifestó que en cuanto al formato de acta que se utiliza para dar la formalidad legal al acto entrega-recepción en ella solo participa la titular de este Órgano Electoral, toda vez que es quien recibe la edificación acordada.

**Por lo que toca al quinto punto del Orden del Día**, la Comisionada Presidenta preguntó si existía algún reporte de daños por el préstamo que se realizó de la sala de pleno a este Consejo, comentando el Ing. Carlos A. Macías Martínez que se encontraron unas manchas en los muros y se dañaron unos contactos a lo que expreso la Comisionada Presidenta que si esos contactos se habían dañado por ser de mala calidad o por mal uso, respondiendo el Supervisor que había sido por el mal uso.

**En lo concerniente al sexto punto del Orden del Día**, la Comisionada Presidenta, solicito al Ing. Carlos A. Macías Martínez, informe sobre los trabajos de descarga pluvial que se están realizando en la obra que nos ocupa, respondiendo el Ingeniero Macías Martínez que solicita permiso a este Consejo para que retiren del estacionamiento de los Consejeros sus vehículos por unos días, toda vez, que conforme al proyecto y catálogo de conceptos es por ahí donde en forma subterránea transita el dren que lleva la descarga-pluvial del agua que recaba, por lo que le es necesario abrir dicho paso para realizar la conexión correspondiente, y dejar concluido ese concepto; manifestando los Comisionados ahí presentes estar de acuerdo con su solicitud.

**En lo que corresponde al séptimo punto del Orden del Día**, la Comisionada Presidenta pregunto al Ing. Carlos A. Macías Martínez, que en cuanto al tema de los informes financieros que conforme al convenio de colaboración debían de rendirse mensualmente a este Consejo y no ha sido así, esta Comisión le solicita que se hagan llegar a la brevedad posible el resto de las estimaciones que se hayan realizado, a efecto de que esta Comisión esté debidamente informada de cómo se encuentra el estado financiero de dicha obra.

Acto seguido la Comisionada Presidenta, le solicito al Ing. Carlos A. Macías Martínez, que verifique muy bien que la construcción que nos atañe, no presente filtraciones de agua, ya que el muro morado que divide al edificio "A" del "B" como se puede ver esta almacenando agua en la parte superior del mismo, respondiendo el Supervisor que en cuanto a ese muro ellos no lo tocaron en el desarrollo de la construcción de la sala de pleno.

Por lo referente al octavo punto el Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, se informó que no se contaba con asuntos agendados.

**Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:**

**14/06/2015.** Punto 2 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día.

**15/06/2015.** Punto 3 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el acta de sesión ordinaria de fecha 28 abril de 2015.


**16/06/2015.** Punto 5 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, informar a los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que retiren del estacionamiento sus vehículos, a efecto de realizar la excavación correspondiente para la conexión del dren-pluvial.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.


**COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC,**




**LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL**  
COMISIONADA PRESIDENTA

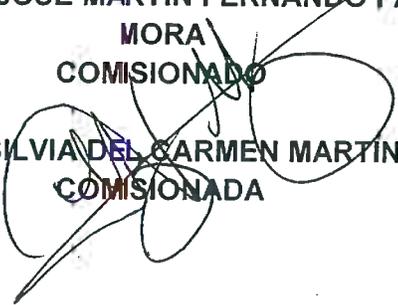

**MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ**  
**MORA**  
COMISIONADO

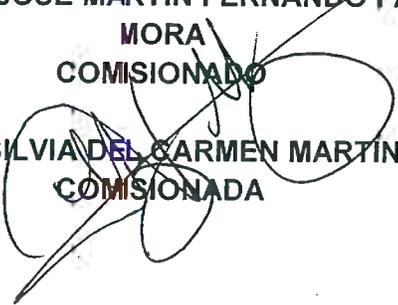

**MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ**  
COMISIONADA



**LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO**  
COMISIONADA



**LIC. LIZBETH LARA TOVAR**  
SECRETARIA TÉCNICA



**ING. JESÚS RODRÍGUEZ VENTURA**

Sierra Leona No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216  
San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077
